TB-Architektur

Bauablaufplan; Stand Oktober 2017

Dateiname: Evangelische Kirche Spansberg

Zeitraum: 30.09.2017 - 31.01.2019

Datum: 30.10.2017
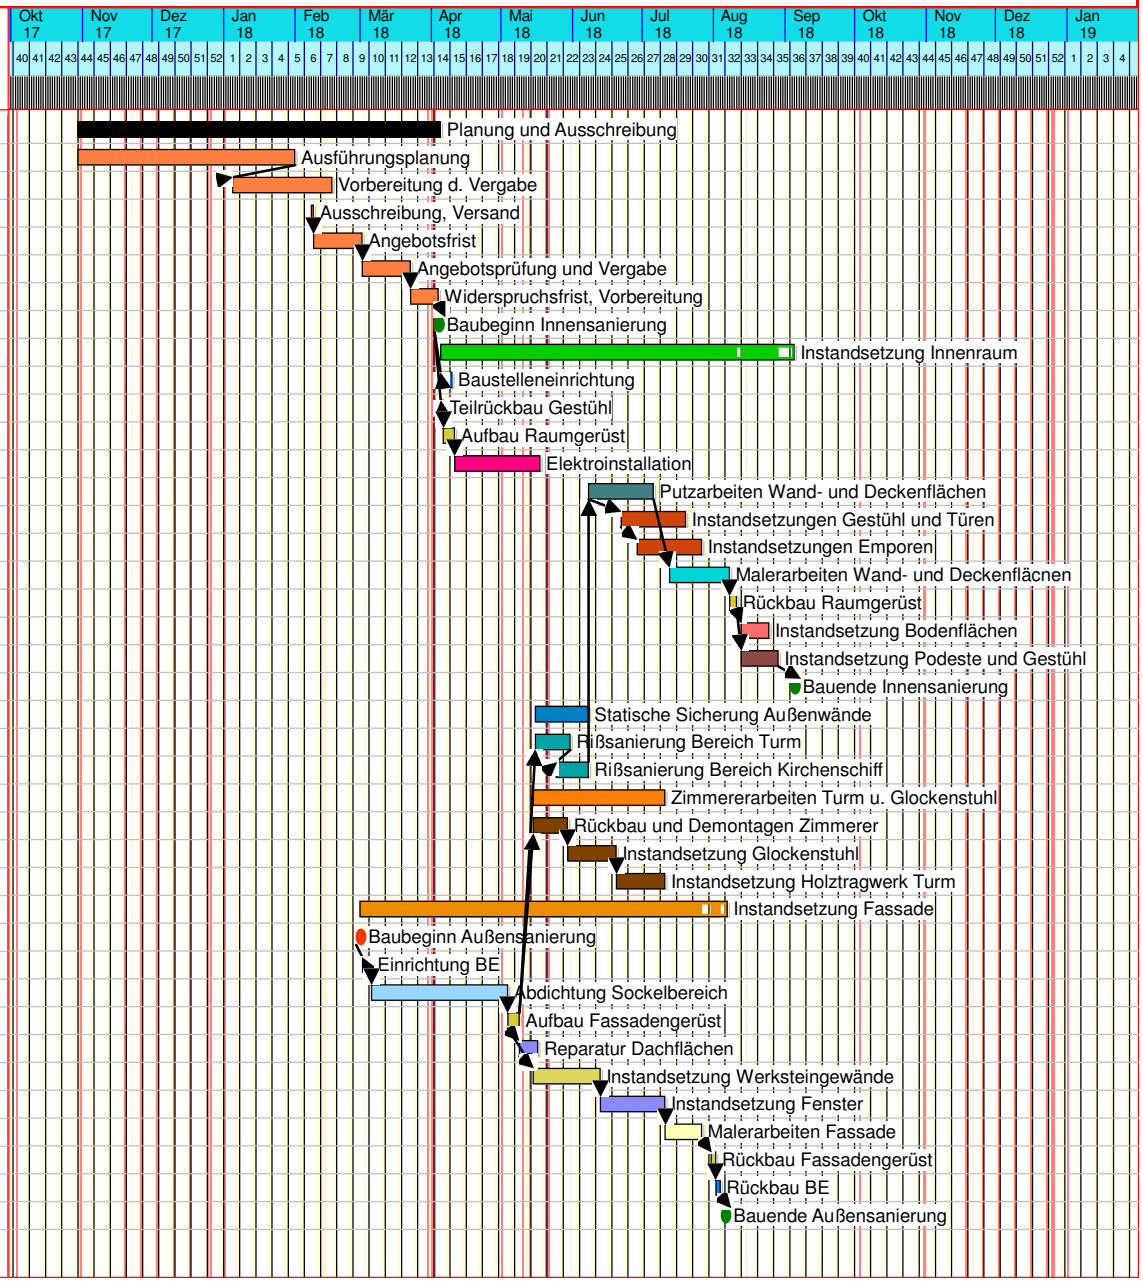
Nr.:	Name:	S-Start:	S-Ende:		
1	**Planung und Ausschreibung**	**30.10.2017**	**04.04.2018**	**108**	**AT**
1.1	Ausführungsplanung	30.10.2017	31.01.2018	65	AT
1.2	Vorbereitung d. Vergabe	05.01.2018	16.02.2018	32	AT
1.3	Ausschreibung, Versand	08.02.2018	08.02.2018	1	AT
1.4	Angebotsfrist	09.02.2018	01.03.2018	21	KT
1.5	Angebotsprüfung und Vergabe	02.03.2018	22.03.2018	21	KT
1.6	Widerspruchsfrist, Vorbereitung	23.03.2018	03.04.2018	12	KT
1.7	Baubeginn Innensanierung	04.04.2018			
2	**Instandsetzung Innenraum**	**05.04.2018**	**04.09.2018**	**101**	**AT**
2.1	Baustelleneinrichtung	05.04.2018	09.04.2018	3	AT
2.2	Teilrückbau Gestühl	05.04.2018	05.04.2018	1	AT
2.3	Aufbau Raumgerüst	06.04.2018	10.04.2018	3	AT
2.4	Elektroinstallation	11.04.2018	17.05.2018	25	AT
2.5	Putzarbeiten Wand- und Deckenflächen	08.06.2018	05.07.2018	20	AT
2.6	Instandsetzungen Gestühl und Türen	22.06.2018	19.07.2018	20	AT
2.7	Instandsetzungen Emporen	29.06.2018	26.07.2018	20	AT
2.8	Malerarbeiten Wand- und Deckenflächen	13.07.2018	07.08.2018	18	AT
2.9	Rückbau Raumgerüst	08.08.2018	10.08.2018	3	AT
2.10	Instandsetzung Bodenflächen	13.08.2018	24.08.2018	10	AT
2.11	Instandsetzung Podeste und Gestühl	13.08.2018	28.08.2018	12	AT
2.12	Bauende Innensanierung	05.09.2018			
2.13	**Statische Sicherung Außenwände**	**16.05.2018**	**07.06.2018**	**16**	**AT**
2.13.1	Rißsanierung Bereich Turm	16.05.2018	30.05.2018	10	AT
2.13.2	Rißsanierung Bereich Kirchenschiff	25.05.2018	07.06.2018	10	AT
2.14	**Zimmererarbeiten Turm u. Glockenstuhl**	**15.05.2018**	**10.07.2018**	**40**	**AT**
2.14.1	Rückbau und Demontagen Zimmerer	15.05.2018	29.05.2018	10	AT
2.14.2	Instandsetzung Glockenstuhl	30.05.2018	19.06.2018	15	AT
2.14.3	Instandsetzung Holztragwerk Turm	20.06.2018	10.07.2018	15	AT
3	**Instandsetzung Fassade**	**01.03.2018**	**06.08.2018**	**106**	**AT**
3.1	Baubeginn Außensanierung	01.03.2018			
3.2	Einrichtung BE	02.03.2018	05.03.2018	2	AT
3.3	Abdichtung Sockelbereich	06.03.2018	03.05.2018	40	AT
3.4	Aufbau Fassadengerüst	04.05.2018	08.05.2018	3	AT
3.5	Reparatur Dachflächen	09.05.2018	16.05.2018	5	AT
3.6	Instandsetzung Werksteingewände	15.05.2018	12.06.2018	20	AT
3.7	Instandsetzung Fenster	13.06.2018	10.07.2018	20	AT
3.8	Malerarbeiten Fassade	11.07.2018	26.07.2018	12	AT
3.9	Rückbau Fassadengerüst	31.07.2018	01.08.2018	2	AT
3.10	Rückbau BE	02.08.2018	03.08.2018	2	AT
3.11	Bauende Außensanierung	06.08.2018
